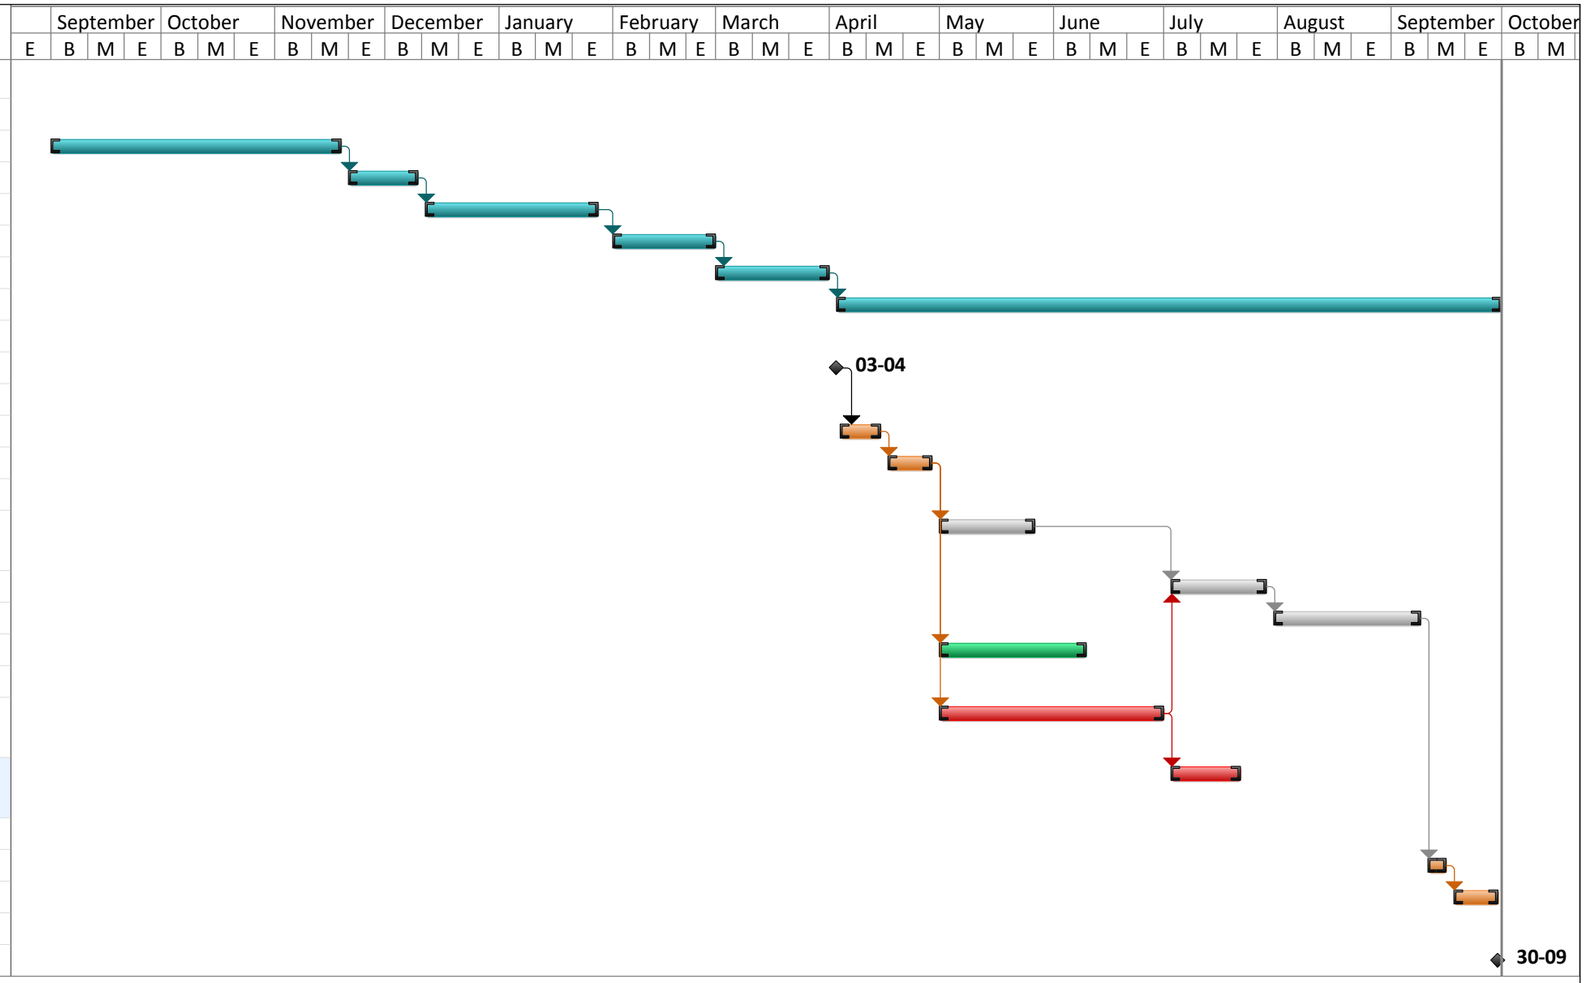ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**East Kilbride Badet**			
2				
3	Opstart Projektering	57 days	Thu 01-09-16	Fri 18-11-16
4	KS og kommentering	15 days	Mon 21-11-16	Fri 09-12-16
5	Udbud	35 days	Mon 12-12-16	Fri 27-01-17
6	Licitation	20 days	Wed 01-02-17	Tue 28-02-17
7	Entreprisekontrakt	23 days	Wed 01-03-17	Fri 31-03-17
8	Byggeperiode	131 days	Mon 03-04-17	Sat 30-09-17
9				
10	Byggestart	0 days	Mon 03-04-17	Mon 03-04-17
11				
12	Byggeplads	9 days	Tue 04-04-17	Fri 14-04-17
13	Tømning af bassin	10 days	Mon 17-04-17	Fri 28-04-17
14				
15	2-1 Vandbehandling med tromlesigte og sandfiltre	20 days	Mon 01-05-17	Fri 26-05-17
16	2-2 Dyser og Hovedrør	20 days	Mon 03-07-17	Fri 28-07-17
17	3 Udskiftning af bassinfolie	30 days	Mon 31-07-17	Fri 08-09-17
18	4 Gennemgang af promenader	30 days	Mon 01-05-17	Fri 09-06-17
19				
20	5a Udskiftning af kassetter + 5b Forstærkning af limtræsrammer	45 days	Mon 01-05-17	Fri 30-06-17
21	6 Renovering af betonkonstruktioner	15 days	Mon 03-07-17	Fri 21-07-17
22				
23	Fyldning af bassin	5 days	Mon 11-09-17	Fri 15-09-17
24	Indkøring af vandbehandling	10 days	Mon 18-09-17	Fri 29-09-17
25				
26	Byggeslut	0 days	Sat 30-09-17	Sat 30-09-17
